

«Утверждаю»
Председатель контрольно-счетной палаты
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

_____ **Ю.О. Жучков**

«26» марта 2020 года

**Мониторинг освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте объектов в городском округе - город Волжский Волго-
градской области за 2019 год.**

Волжский 2019

Мониторинг освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в городском округе - город Волжский Волгоградской области за 2019 год.

Пояснительная записка

Мониторинг освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в городском округе - город Волжский Волгоградской области –это мероприятие постоянного контрольного наблюдения, проводимые Контрольно-счетной палатой городского округа-город Волжский Волгоградской области, позволяющие сформировать данные о динамике, эффективности и результативности расходования бюджетных средств.

Мониторинг проводится на основании пункта 5.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2019 год, утвержденного решением коллегии (протокол от 25.12.2018 №9/5).

Целью проводимого мониторинга является:

- получение достоверной информации по вопросам освоения финансов, своевременности реализации производственных и организационных мероприятий, городских целевых программ;
- информирование депутатов Волжской городской Думы, администрации городского округа-город Волжский о результатах проводимого мониторинга;
- своевременное обнаружение негативных тенденций, разработка предложений и рекомендаций по снижению отрицательных последствий.

Объектом мониторинга являются главные распорядители бюджетных средств городского округа - город Волжский Волгоградской области, в чье распоряжение поступают финансовые средства, и конкретные объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта в городском округе.

Предметом мониторинга является контроль своевременности и эффективности реализации совокупности финансовых, организационных и производственных мероприятий, осуществляемых на объекте контроля.

В качестве объектов наблюдения рассматриваются социально важные объекты, финансируемые из федерального, областного бюджетов и бюджета Волжского.

Результаты мониторинга предоставляются в форме пояснительной записки, графическом виде и при необходимости визуализируются на фотографиях. Графическое представление информации позволяет определить в динамике изменение объемов выполненных работ, объемов финансирования и целого ряда регистрируемых параметров.

Мониторинг в соответствии со ст. 8 Городского положения Волжской городской Думы от 05.04.2012 № 265-ВГД. «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Волгоградской области» относится к полномочиям контрольно-счетной палаты по контролю хода и итогов реализации программ и планов развития города.

Лимиты финансирования объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, включенных в мониторинг Контрольно-счетной палаты, в 2019 году составляют:

Таблица №1

ФКР	Наименование мероприятия	ЛБО	Кассовый расход	Фактическое исполнение
I	МБУ «Комбинат благоустройства» - город Волжский Волгоградской области			
	1. Поддержание технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию.			
0409	Текущий ремонт дорог общего пользования (п.2.1. перечня работ МЗ)	61 706 960,89	0.00	49 247 214,80
0409	Текущий ремонт внутриквартальных проездов (п.2.2. перечня работ МЗ)	2 681 076,64	0,00	1 120 822,72
	Итого по р.1	68 388 037,52	0,00	64 388 037,53
II	ГРБС – Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области			
	2. Жилищно-коммунальное хозяйство.			
0502	Обследование и мониторинг строительных конструкций по адресу: пр. Ленина,76	98 000,00	98 000,00	98 000,00
0502	Обследование и мониторинг строительных конструкций по адресу: ул. Машиностроителей,19	98 000,00	98 000,00	98 000,00
0502	Обследование и мониторинг строительных конструкций по адресу: ул. Королева,4	98 000,00	98 000,00	98 000,00
0502	Технический надзор за проведением ремонтных работ в здании по адресу ул. Молодежная, д.46	16 425,59	16 425,59	16 425,59
0502	То же, ул. Пушкина,34	37 553,26	0,00	34 942.81
0502	То же, ул. Пушкина,40	47 993,25	0,00	38 244.92
0502	Кредиторская задолженность	2 588 326,20	2 588 326,20	0,00
0502	Ремонтно-восстановительные работы общего имущества, ранее имевшего статус общежития по адресу: ул. Пушкина,40	2 677 756,42	2 123 603.00	2 222 227,00
0502	То же, ул. Пушкина,34	2 000 498,60	1 792 889,00	1 878 515,00
0502	Разработка ПСД на ремонт здания по адресу: ул. Королева,4	93 524,80	93 524,80	93 524,80
0502	То же, ул. Машиностроителей,19	93 524,81	93 524,81	93 524,81
0502	То же, пр. Ленина,76	93 524,81	93 524,81	93 524,81

	Итого по р.2	7 943 127,74	7 095 818,21	4 764 929,74
III	ГРБС - Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области			
	3. Строительство, реконструкция автомобильных дорог (ЖГС).			
0409	Содержание объекта незавершенного строительства: автодорога по ул. им. Генерала Карбышева от ул.87-я Гвардейская до ул. им. Р.С. Медведева	68 602,6	68 602,65	68 602,65
	Итого по р.3	68 602,65	68 602,65	68 602,65
	4. Строительство коммунальной инфраструктуры (ЖГС).			
0502	Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 (в том числе корректировка ПСД)	35 901 867,40	35 276 331,85	35 5654 373,95
0502	Строительство и разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие мкр №1 «Мираж», р.п. Краснооктябрьский)	15 000,00	0,00	0,00
0502	Строительство и разработка ПСД на строительство сетей газоснабжения (развитие мкр №1 «Мираж», р.п. Краснооктябрьский)	83 000,00	83 000,00	83 000,00
	Итого по р.4	35 999 867,40	35 359 331,85	35 648 373,95
	5. Строительство объектов благоустройства (ЖГС).			
0503	Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД)	6 319 303,78	1 485 776,74	1 526 848,38
0503	Строительство инженерных сетей 28 мкр и прилегающих улиц (проезды, тротуары, площадки улиц) без софинансирования	17 192,00	17 192,00	17 192,00
	Итого по р.5	6 336 495,78	1 502 968,74	1 544 040,38
	6. Строительство объектов социально-культурного назначения (дошкольное образование) (ЖГС).			
0701	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Оломоуцкая,6 (27 микрорайон) (в том числе разработка ПСД)	150 674 670,89	149 888 240,46	205 803 587,17
0701	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии,74 (37 микрорайон) (в том числе разработка ПСД)	147 632 777,29	147 131 341,69	202 063 313,73
0701	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр. им. Ленина,403 (32а микрорайон) (в том числе разработка ПСД)	148 622 707,30	143 347 988,78	203 728 921,38

0701	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24	263 286,62	8 486,62	8 486,62
0701	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16	960 000,00	0,00	0,00
	Итого по р.6	448 153 442,10	440 376 057,55	611 604 308,90
7. Строительство объектов социально-культурного назначения (общее образование) (ЖГС).				
0702	Содержание объекта незавершенного строительства: школа №79 в37 мкр	341 362,00	341 362,00	341 362,00
0702	Строительство школы в 28 мкр на 1500 мест (в том числе разработка ПСД)	1 007 066,00	1 007 066,00	1 007 066,00
	Итого по р.7	1 348 428,00	1 348 428,00	1 348 428,00
8. Стационарная медицинская помощь (ЖГС).				
0901	Содержание объекта незавершенного строительства: «Детский консультативно-диагностический корпус»	33 625,00	33 625,00	33 625,00
	Итого по р.8	33 625,00	33 625,00	33 625,00
9. Развитие физической культуры и массового спорта (МП).				
1102	Строительство универсального спортивного зала «Дом легкой атлетики» по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина,168 (в том числе разработка ПСД)	1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00
1102	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Химиков,1с (в том числе разработка ПСД)	2 435 924,62	14 424,62	14 424,62
1102	Строительство бассейна по адресу: Волгоградская обл., ул. Дружбы,48 (в том числе разработка ПСД)	2 512 712,67	10 212,67	10 212,67
1102	Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Волжский, ул. Набережная,2а (в том числе разработка ПСД)	3 756 388,30	0,00	0,00
1102	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный стадион»	379 195,36	379 195,36	379 195,36
	Итого по р.9	10 411 220,95	1 730 832,65	1 730 832,65
10. Внепрограммные мероприятия.				
0503	Капитальный ремонт спортзала школы №15	963 497,00	963 497,00	963 497,00
0701	Капитальный ремонт д/с №48 «Ягодка»	10 000,00	10 000,00	10 000,00

	Итого по р.10	963 497,00	963 497,00	963 497,00
	Итого по р.р. 3-12	503 325 178,88	481 393 343,44	652 951 708,53
IV	ГРБС - Управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области			
	11.Объекты муниципальных учреждений дополнительного образования.			
0703	Замена асфальтового покрытия в МБУ ДО «ДТ «Русинка»	728 627,00	728 627,00	728 627,00
	Итого по р.13	728 627,00	728 627,00	728 627,00
	12.Объекты муниципальных общеобразовательных учреждений.			
0702	Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ	7 692 700,00	7 692 700,00	7 692 700,00
0702	Ремонт стадиона и спортивных площадок с осуществлением технадзора в МОУ СШ №13	5 233 748,00	5 233 748,00	5 233 748,00
0702	Ремонт стадиона и спортивных площадок с осуществлением технадзора в МОУ СШ №28	4 039 908,00	4 039 606,62	4 039 606,62
0702	Окраска стен здания школы МОУ СШ №22	491 507,48	491 507,48	491 507,48
0702	Ремонт стадиона и спортивных площадок с осуществлением технадзора в МОУ «Кадетская школа»	3 517 174,00	3 517 174,00	3 517 174,00
0702	Ремонт стадиона и спортивных площадок с осуществлением технадзора в МОУ СШ №27	2 031 783,00	2 031 783,00	2 031 783,00
0702	Ремонт стадиона и спортивных площадок с осуществлением технадзора в МОУ СШ №24	3 977 219,00	3 977 219,00	3 977 219,00
0702	Ремонт крыльца МОУ СШ №37	55 697,00	55 697,00	55 697,00
0702	Ремонт фасада МОУ СШ №2	846 601,00	836 149,83	836 149,83
	Итого по р.14	27 886 337,48	27 875 583,93	27 875 583,93
	13. Объекты дошкольных образовательных учреждений.			
0701	Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ	7 737 730,00	7 737 730,00	7 737 730,00
0701	Реализация программы «Доступная среда» в МДОУ д/с №104	911 966,00	911 966,00	911 966,00
0701	Ремонт кровли и осуществление технического надзора в МДОУ д/с №104	1 777 066,00	1 777 044,55	1 777 044,55
	Итого по р.15	10 426 762,00	10 426 740,55	10 426 740,55

	Итого по р.р. 13-15	39 041 726,48	39 030 951,48	39 030 951,48
V	ГРБС - Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области			
	14. Использование средств муниципального дорожного фонда в 2019 году.			
0409	Содержание и ремонт дорог в рамках оказания муниципальных услуг	147 630 075,00	147 630 075,00	147 630 075,00
0409	Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области: пр. Ленина, автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС (проезды №№40-43, 59-78)	23 818 551,00	23 818 551,00	23 818 551,00
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Комсомольская от пр. Ленина до ул. Горького	3 738 994,80	3 738 994,80	3 738 994,80
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Оломоуцкая от пр. Ленина до ул. Пушкина	17 768 815,88	17 768 815,88	17 768 815,88
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Карбышева от ул. Энгельса до ул. Королева	3 343 248,90	3 343 248,90	3 343 248,90
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. 19 Партсъезда от ул. Логинова до ул. Дорожная	6 728 735,56	6 728 735,56	6 728 735,56
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Свердлова от кольца СЭС до ул. Кирова	4 635 776,38	4 635 776,38	4 635 776,38
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Нариманова от ул. Александра до ул. Пушкина	6 304 546,50	6 304 546,50	6 304 546,50
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Дружбы от ул. Оломоуцкая до ул. 87 Гвардейская	6 764 059,60	6 764 059,60	6 764 059,60
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Александра от пр. Ленина до ул. Пушкина	18 530 287,78	18 530 287,78	18 530 287,78
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкая	13 646 301,54	13 646 301,54	13 646 301,54
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Александра от пр. Ленина до ул. Пушкина (ямочный ремонт)	91 142,00 (контракт расторгнут)	0,00	0,00
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкая (демонтаж бортовых камней)	74 313,00 (контракт расторгнут)	0,00	0,00
0409	Ремонт автомобильных дорог г. Волжский: ул. Оломоуцкая от пр. Ленина до ул. Пушкина (исправление поперечного профиля)	82 638,00 (контракт расторгнут)	0,00	0,00
0409	Осуществление строительного контроля (пр. Ленина в районе плотины)	99 800,00	99 800,00	99 800,00
0409	Осуществление авторского надзора (пр. Ленина, автодорожный комплекс в со-	99 999,99	0,00	99 999,99

	ставе Волжской ГЭС – пролетные строения)			
0409	Осуществление авторского надзора (пр. Ленина, автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС – мостовое полотно)	99 999,99	81 553,71	99 999,99
0409	Осуществление технического надзора (автомобильные дороги г. Волжский)	99 999,99	99 999,99	99 999,99
0409	Осуществление строительного контроля (пр. Ленина, автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС)	1 500 000,00	1 486 427,99	1 486 427,99
0409	Осуществление строительного контроля (автомобильные дороги г. Волжский)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0409	Оценка технического состояния путепровода через ж/д пути по ул. Александра в промышленной зоне г. Волжский	299 504,00	299 504,00	299 504,00
0409	Оценка технического состояния моста через р. Ахтуба на о. Зеленый	91 077,00	91 077,00	91 077,00
0409	Оценка технического состояния путепровода по ул. Александра в промышленной зоне г. Волжский	208 788,00	208 788,00	208 788,00
0409	Осуществление авторского надзора за ремонтом автомобильных дорог г. Волжский (ул. Свердлова от ул. Карбышева до ул. Кирова)	67 721,74	67 721,74	67 721,74
0409	Осуществление авторского надзора за ремонтом автомобильных дорог г. Волжский (ул. Дружбы от ул. Оломоуцкая до ул. 87 Гвардейская, ул. 19 Партсъезда, ул. Нариманова от ул. Александра до ул. Пушкина)	256 918,07	256 918,07	256 918,07
0409	Осуществление авторского надзора за ремонтом автомобильных дорог г. Волжский (ул. Александра от пр. Ленина до ул. Пушкина, ул. Мира от ул. В.В. Флотилии до ул. Оломоуцкая, ул. Оломоуцкая от пр. Ленина до ул. Пушкина)	299 999,00	299 999,00	299 999,00
0409	Ремонт дорог силами МБУ КБ	26 720 583,06	26 720 583,06	26 720 583,06
0409	Устройство остановочных пунктов	4 093 409,00	4 093 409,00	4 093 409,00
0409	Ремонт внутриквартальных проездов: ул. Мира,5,5а	3 298 313,15	3 298 313,15	3 298 313,15
0409	Корректировка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог: ул. Молодежная от пр. Ленина до ул. Набережная,10	81 840,00	81 840,00	81 840,00
0409	Корректировка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог: ул. К. Маркса от ул. Комсомольская до ул. Дорожная	102 950,00	102 950,00	102 950,00
0409	Разработка сметной документации на ремонт мостового комплекса в составе Волжской ГЭС	299 343,00	299 343,00	299 343,00

0409	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог: ул. Химиков от пл. Труда до кольца ВПЗ	275 251,05	275 251,05	275 251,05
0409	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог: ул. 40 лет Победы от ул. Карбышева до ул. Мира	299 999,00	299 999,00	299 999,00
0409	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог: ул. О. Кошевого	299 999,00	299 999,00	299 999,00
0409	Ремонт подъездной дороги к МДОУ д/с №59 (ул. Горького,31), внутриквартальных проездов: пр. Ленина,71, ул. Дружбы,79, мостовой комплекс Волжской ГЭС	106 466,45	106 466,45	106 466,45
0409	Ремонт внутриквартальных проездов: ул. Мечникова,6, ул. Свердлова,37	282 620,00	282 620,00	282 620,00
0409	Ремонт подъездной дороги к МДОУ д/с №30 (ул. Северная,1)	251 993,29	251 993,29	251 993,29
0409	Ремонт внутриквартальных проездов: ул. Советская,36, ул. Пионерская,19	283 766,00	283 766,00	283 766,00
0409	Ремонт внутриквартальных проездов: ул. Коммунистическая,36	239 427,00	239 427,00	239 427,00
0409	Ремонт внутриквартальных проездов: ул. 19 Партсъезда,85-87, ул. Комсомольская,12, ул. Советская,34	284 642,00	284 642,00	284 642,00
0409	Ремонт внутриквартальных проездов: ул. К. Нечаевой,7	291 528,00	291 528,00	291 528,00
0409	Ремонт внутриквартальных проездов: ул. К. Нечаевой,9, ул. Советская,38	283 353,00	283 353,00	283 353,00
0409	Ремонт подъездной дороги к МДОУ д/с №76, МОУ СШ №24 (мкр 9), МОУ «Кадетская школа»	252 032,85	252 032,85	252 032,85
0409	Ремонт подъездной дороги к МДОУ д/с №53 (ул. Карбышева,53), МОУ СШ №12	252 879,51	252 879,51	252 879,51
0409	Ремонт подъездной дороги к МОУ СШ №24 (ул. Пушкина,44)	245 623,64	245 623,64	245 623,64
0409	Корректировка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог: ул. Мира от пл. Труда до ул. Оломуцкая, от ул. В.В. Флотилии до ул. Медведева	80 880,00	80 880,00	80 880,00
0409	Инженерно-геодезические изыскания на ремонт автомобильной дороги: ул. Химиков от пл. Труда до ул. 7-я Автодорога	141 422,40	141 422,40	141 422,40
0409	Ремонт внутриквартальных проездов: ул. Советская,32	283 536,00	283 536,00	283 536,00
0409	Ремонт внутриквартальных проездов: ул. Набережная,71	243 224,00	243 224,00	243 224,00
0409	Ремонт пешеходных дорожек городского округа	288 495,00	276 854,00	276 854,00
0409	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог: ул. Мечникова от ул. Карбышева до пр.	265 281,00	265 281,00	265 281,00

	Ленина			
0409	Диагностика автомобильных дорог городского округа	1 977 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00
0409	Разработка проектно-сметной документации на транспортную развязку: пр. Ленина – ул. Горького (1-й этап)	299 999,00	299 999,00	299 999,00
0409	Разработка проектно-сметной документации на транспортную развязку: пр. Ленина – ул. Горького (2-й этап)	299 999,00	299 999,00	299 999,00
0409	Корректировка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог: ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до СНТ «Дружба»	266 646,48	0,00	266 646,48
0409	Испытание дорожной разметки автомобильных дорог городского округа	77 180,00	77 180,00	77 180,00
0409	Экспертиза сметной документации на ремонт мостового комплекса в составе Волжской ГЭС	95 000,00	95 000,00	95 000,00
0409	Разработка проектно-сметной документации на устройство проезда с пр. Ленина к ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера»	245 393,00	0,00	245 393,00
	Итого по р.16	299 843 372,20	299 040 192,85	299 670 678,60

1. Поддержание технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию.

1) В соответствии с п.2.1. отчета о выполнении муниципального задания на 2019 год для МБУ «Комбинат благоустройства» (далее по тексту - МБУ КБ) на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в 2019 году в рамках муниципального задания выделено 61 706 960,89 рублей. На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета силами МБУ КБ выполнены работы на сумму 49 247 214,80 рублей или 79,81% от установленных лимитов.

2) В соответствии с п.2.2. отчета о выполнении муниципального задания на 2019 год для МБУ КБ на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов в 2019 году в рамках муниципального задания выделено 2 681 076,64 рублей. На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета силами МБУ КБ выполнены работы на сумму 1 120 822,72 рублей или 41,80% от установленных лимитов.

3) Пояснение по причинам невыполнения муниципального задания МБУ КБ не предоставлено.

2. Жилищно-коммунальное хозяйство.


По информации Комитета по обеспечению жизнедеятельности города (далее по тексту – КЖД) в рамках реализации ведомственной целевой программы «Жи-

лично-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2020 годы для выполнения строительных работ в 2019 году выделены финансы городского бюджета в размере 7 943 127,74 рублей.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение составило 4 764 929.74 рублей или 59.99% от установленных лимитов, кассовый расход составил 7 095 818.21 рублей или 89.33% от установленных лимитов. По информации КЖД:

- превышение кассового расхода над фактическим исполнением объясняется оплатой кредиторской задолженности;

- не освоение лимитов бюджетных отчислений связано с внесением изменений в проектно-сметную документацию с последующим уменьшением объемов договорных работ.

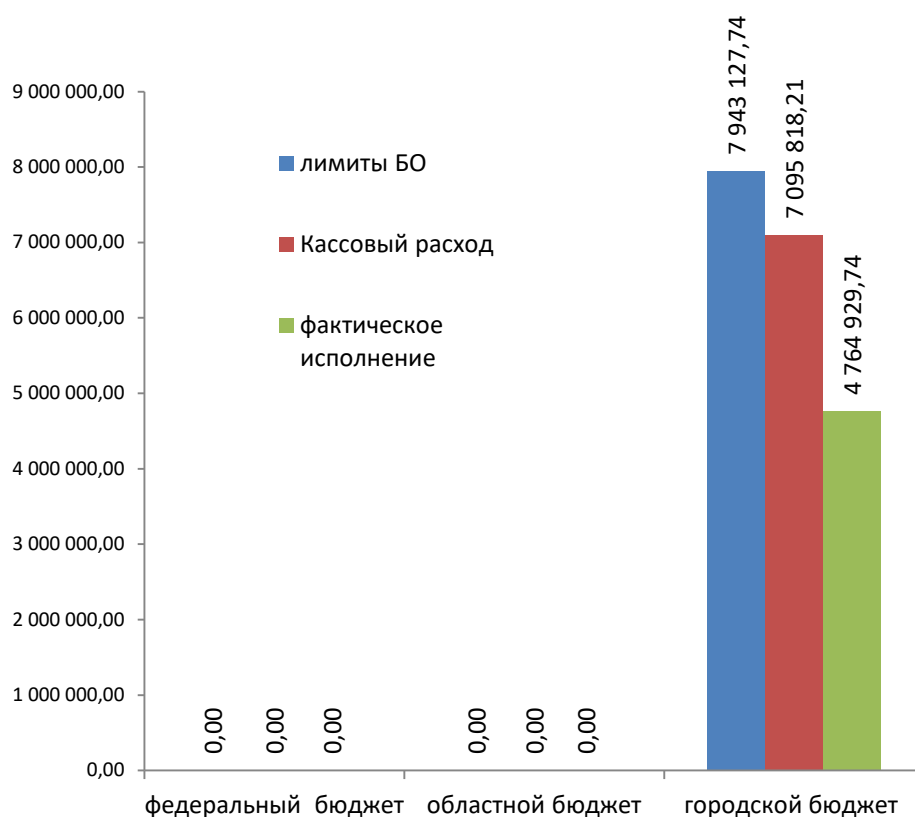

3. Дорожное хозяйство (ЖГС).

В целях приведения муниципальной адресной инвестиционной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792 (с изменениями) для выполнения задачи «Строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа» в соответствии с ЛБО на 2019 год предусмотрено:

1) На содержание объекта незавершенного строительством - автодорога по ул. им. Генерала Карбышева от ул. 87 Гвардейская до ул. им. Р.С. Медведева:

68 602,65 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 68 602,65 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

4. Строительство объектов коммунального хозяйства (ЖГС).

В целях приведения муниципальной адресной инвестиционной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792 (с изменениями) для выполнения задачи «Строительство коммунальной инфраструктуры» в соответствии с ЛБО на 2019 год предусмотрено:

1) На строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 (в том числе корректировка проектно-сметной документации):

35 901 867,40 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение составило 35 565 373,95 рублей или 99,06% от установленных лимитов, кассовый расход составил 35 276 331,85 рублей или 98,26% от установленных лимитов.

По информации УКС не освоение лимитов объясняется экономией денежных средств по фактически произведенным расходам.

2) На строительство и разработку ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие мкр 1 «Мираж», р.п. Краснооктябрьский) было выделено 15 000,00 рублей финансовых средств городского бюджета. Согласно пояснению УКС в связи с отсутствием средств по софинансированию из вышестоящих бюджетов работы на данном объекте не выполнялись.

3) На строительство и разработку ПСД на строительство сетей газоснабжения (развитие мкр 1 «Мираж», р.п. Краснооктябрьский):

83 000,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 83 000,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

5. Строительство объектов благоустройства (ЖГС).

В целях приведения муниципальной адресной инвестиционной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792 (с изменениями) для выполнения задачи «Строительство объектов благоустройства» в соответствии с ЛБО на 2019 год предусмотрено:

1) На строительство наружного освещения (в том числе разработка ПСД):

6 319 303,78 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение составило 1 526 848,38 рублей или 24,16% от установленных лимитов, кассовый расход составил 1 485 776,74 рублей или 23,51% от установленных лимитов.

Согласно пояснению УКС не освоение лимитов объясняется поздним выделением денежных средств, а именно 09.10.2019 года, и длительностью проведения конкурсных процедур.

2) На строительство инженерных сетей 28 м/р и прилегающих улиц:
17 192,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 17 192,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

6. Строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней (ЖГС).

В целях приведения муниципальной адресной инвестиционной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792 (с изменениями) для выполнения задачи «Строительство объектов социального назначения» в соответствии с ЛБО на 2019 год предусмотрено:

1) На строительство дошкольного образовательного учреждения (240 мест) по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая,6 (27 микрорайон) (в том числе разработка проектно-сметной документации):

76 368 389,65 рублей – финансовых средств федерального бюджета,

57 152 151,82 рублей – финансовых средств областного бюджета,

17 154 129,42 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов федерального бюджета фактическое исполнение составило 124 449 702,86 рублей или 162,96% от установленных лимитов, кассовый расход составил 76 368 389,65 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполнение составило 62 786 067,46 рублей или 109,86% от установленных лимитов, кассовый расход составил 56 524 314,36 рублей или 98,90% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение составило 18 567 816,25 рублей или 108,24% от установленных лимитов, кассовый расход составил 16 995 536,45 рублей или 99,08% от установленных лимитов.

Согласно пояснению УКС:

- превышение фактического исполнения над лимитами 2019 года объясняется произведенным зачетом авансов 2018 года;

- общее не освоение лимитов объясняется экономией денежных средств по результатам конкурсных процедур и по фактически произведенным расходам.

2) На строительство дошкольного образовательного учреждения (240 мест) по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии,74 (37 микрорайон) (в том числе разработка проектно-сметной документации):

76 371 321,74 рублей – финансовых средств федерального бюджета,

54 811 963,67 рублей – финансовых средств областного бюджета,

16 449 491,88 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов федерального бюджета фактическое исполнение составило 123 604 788,64 рублей или 161,85% от установленных лимитов, кассовый расход составил 76 371 321,74 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполнение составило 60 584 853,36 рублей или 110,53% от установленных лимитов, кассовый расход составил 54 427 439,15 рублей или 99,30% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение составило 17 873 671,73 рублей или 108,65% от установленных лимитов, кассовый расход составил 16 332 580,80 рублей или 99,30% от установленных лимитов.

Согласно пояснению УКС:

- превышение фактического исполнения над лимитами 2019 года объясняется произведенным зачетом авансов 2018 года;

- общее не освоение лимитов объясняется экономией денежных средств по результатам конкурсных процедур и по фактически произведенным расходам.

3) На строительство дошкольного образовательного учреждения (240 мест) по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 403 (32а микрорайон) (в том числе разработка проектно-сметной документации):

76 370 224,82 рублей – финансовых средств федерального бюджета,

55 592 930,82 рублей – финансовых средств областного бюджета,

16 659 551,66 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов федерального бюджета фактическое исполнение составило 125 920 877,89 рублей или 164,88% от установленных лимитов, кассовый расход составил 76 370 224,82 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполнение составило 61 647 099,38 рублей или 110,89% от установленных лимитов, кассовый расход составил 50 359 681,13 рублей или 90,59% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение составило 18 160 944,11 рублей или 109,01% от установленных лимитов, кассовый расход составил 16 618 082,83 рублей или 99,75% от установленных лимитов.

Согласно пояснению УКС:

- превышение фактического исполнения над лимитами 2019 года объясняется произведенным зачетом авансов 2018 года;

- общее не освоение лимитов объясняется экономией денежных средств по результатам конкурсных процедур и по фактически произведенным расходам.

4) На строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24:

263 286,62 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 8 486,62 рублей или 3,22% от установленных лимитов.

Согласно пояснению УКС не освоение лимитов связано с нарушением подрядной организацией ООО «ЭнергоСервис» договорных сроков исполнения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации.

5) На строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16: 960 000,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход отсутствуют.

Согласно пояснению УКС не освоение лимитов связано с нарушением подрядной организацией ООО «ЭнергоСервис» договорных сроков исполнения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации.

7. Общее образование (ЖГС).

В целях приведения муниципальной адресной инвестиционной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792 (с изменениями) для выполнения задачи «Строительство объектов социального назначения» в соответствии с ЛБО на 2019 год предусмотрено:

1) На содержание объекта незавершенного строительства – школы №79 в 37 мкр:

341 362,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 341 362,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

2) На строительство школы в 28 мкр на 1500 мест (в том числе разработка проектно-сметной документации):

1 007 066,00 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 1 007 066,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

8. Стационарная медицинская помощь (ЖГС).

В целях приведения муниципальной адресной инвестиционной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792 (с изменениями) для выполнения задачи «Стационарная медицинская помощь» в соответствии с ЛБО на 2019 год предусмотрено:

1) На содержание объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический корпус»:

33 625,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 33 625,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

9. Массовый спорт (ЖГС).

В целях приведения муниципальной адресной инвестиционной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792 (с изменениями) для выполнения задачи «Физкультура и спорт. Массовый спорт» в соответствии с ЛБО на 2019 год предусмотрено:

1) На строительство универсального спортивного зала «Дом легкой атлетики» по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 168а (в том числе разработка проектно-сметной документации):

1 327 000,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 1 327 000,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

2) На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с (в том числе разработка проектно-сметной документации):

2 435 924,62 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату фактическое исполнение и кассовый расход составили 14 424,62 рублей или 0,59% от установленных лимитов.

Согласно пояснению УКС не освоение лимитов связано с нарушением подрядной организацией ООО «СовТехЭко» договорных сроков исполнения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации.

3) На строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48 (в том числе разработка проектно-сметной документации):

2 512 712,67 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату фактическое исполнение и кассовый расход составили 10 212,67 рублей или 0,41% от установленных лимитов.

Согласно пояснению УКС не освоение лимитов связано с нарушением подрядной организацией ООО «ЕвроГеоПроект» договорных сроков исполнения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации.

3) На строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Набережная, 2а (в том числе разработка проектно-сметной документации):

3 756 388,30,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход отсутствуют.

Согласно пояснению УКС не освоение лимитов связано с нарушением подрядной организацией ООО «ЕвроГеоПроект» договорных сроков исполнения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации.

4) На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный стадион»:

379 195,36 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату фактическое исполнение и кассовый расход составили 379 195,36 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

10. Внепрограммные мероприятия.

В рамках внепрограммных мероприятий в соответствии с ЛБО на 2019 год предусмотрено

1) На капитальный ремонт спортивного зала МОУ СШ №15:

963 497,00 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату фактическое исполнение и кассовый расход составили 963 497,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

2) На капитальный ремонт МДОУ д/с №48 «Ягодка»:

10 000,00 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату фактическое исполнение и кассовый расход составили 10 000,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

11. Итоги освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в городском округе - город Волжский Волгоградской области управлением капитального строительства за 2019 год.

В целях проведения муниципальных программ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в городском округе - город Волжский Волгоградской области для управления капитального строительства в соответствии с ЛБО на 2018 год было предусмотрено:

229 109 936,21 рублей – финансовых средств федерального бюджета,

167 557 046,31 рублей – финансовых средств областного бюджета,


106 658 196,36 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов федерального бюджета фактическое исполнение составило 371 975 369,39 рублей или 162,36% от установленных лимитов, кассовый расход составил 229 109 936,21 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполнение составило 185 018 020,20 рублей или 110,42% от установленных лимитов, кассовый расход составил 161 311 434,64 рублей или 96,27% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение составило 95 958 318,94 рублей или 89,97% от установленных лимитов, кассовый расход составил 90 971 972,59 рублей или 85,30% от установленных лимитов.

Причины отклонений в показателях освоения лимитов указаны в разделах 3-10 настоящего отчета.

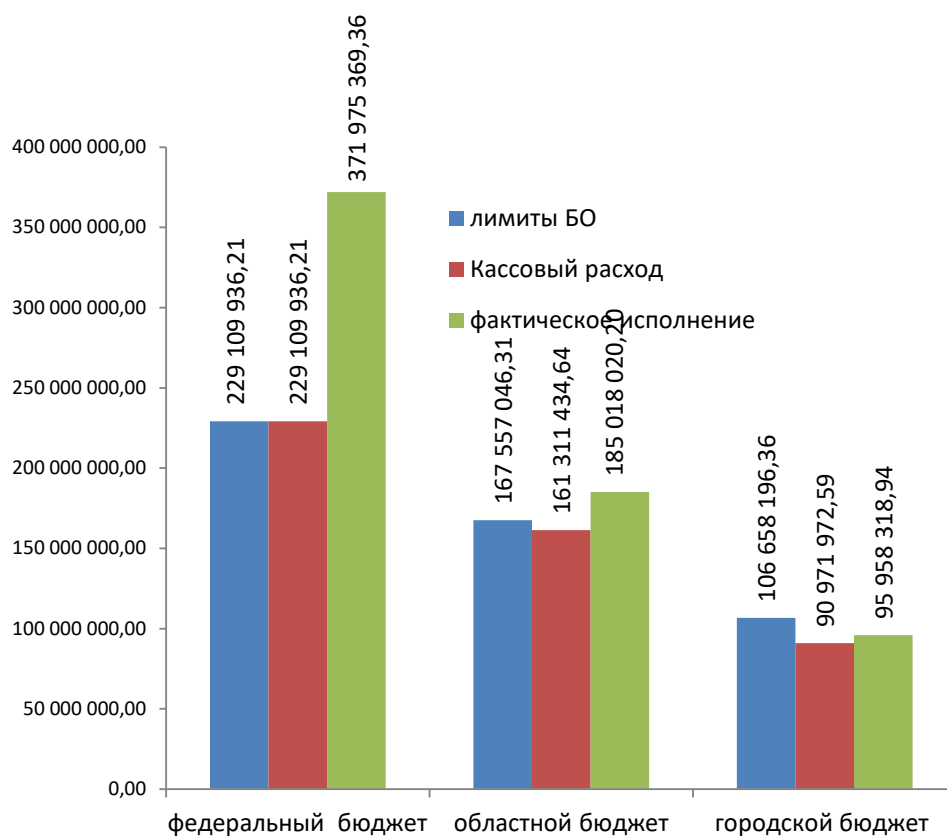

12. Объекты системы образования.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Система образования городского округа – город Волжский на 2018 – 2020 годы», утвержденной приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 №597 (с изменениями), на основании решений Волжской городской Думы от 19.12.2018 №14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с ЛБО на 2019 год было предусмотрено:

1) На замену асфальтового покрытия МБУДО «ДТ «Русинка»:

728 627,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 728 627,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

2) На приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в общеобразовательных учреждениях:

7 685 000,00 рублей – финансовых средств областного бюджета,

7 700,00 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 7 700,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 7 685 000,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

3) На ремонт стадиона и спортплощадок МОУ СШ №13:

5 233 748,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 5 233 748,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

4) На окраску стен здания школы МОУ СШ №22:

491 507,48 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 491 507,48 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

5) На ремонт стадиона и спортплощадок МОУ СШ №24:

3 977 219,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 3 977 219,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

6) На ремонт стадиона и спортплощадок кадетской школы:

3 517 174,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 3 517 174,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

7) На ремонт стадиона и спортплощадок МОУ СШ №27:

2 031 783,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 2 031 782,00 рублей или фактически 100,00% от установленных лимитов.

8) На ремонт стадиона и спортплощадок МОУ СШ №28:

4 039 908,00 рублей - финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 4 039 606,62 рублей или 99,99% от установленных лимитов.

9) На ремонт крыльца МОУ СШ №37:

55 697,00 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 55 697,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

10) На ремонт фасада МОУ СШ №2:

846 601,00 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 836 149,83 рублей или 98,77% от установленных лимитов.

11) На приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в дошкольных образовательных учреждениях:

7 730 000,00 рублей – финансовых средств областного бюджета,

7 730,00 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 7 730,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 7 730 000,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

12) На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда» в МДОУ д/с №104

906 350,00 рублей – финансовых средств областного бюджета,

5 616,00 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 5 616,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 906 350,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

13) На ремонт кровли МДОУ д/с №104:

1 777 066,00 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое выполнение и кассовый расход составили 1 777 044,55 рублей или фактически 100,00% от установленных лимитов.

13. Итоги освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в городском округе - город Волжский Волгоградской области Управлением образования за 2019 год.


В рамках реализации ведомственной целевой программы «Система образования городского округа – город Волжский на 2018 – 2020 годы» для управления образования в соответствии с ЛБО на 2019 год было предусмотрено:

16 321 350,00 рублей – финансовых средств областного бюджета,

22 720 376,48 рублей – финансовых средств городского бюджета.

На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 16 321 350,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов.

На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение и кассовый расход составили 22 709 601,48 рублей или 99,95% от установленных лимитов.

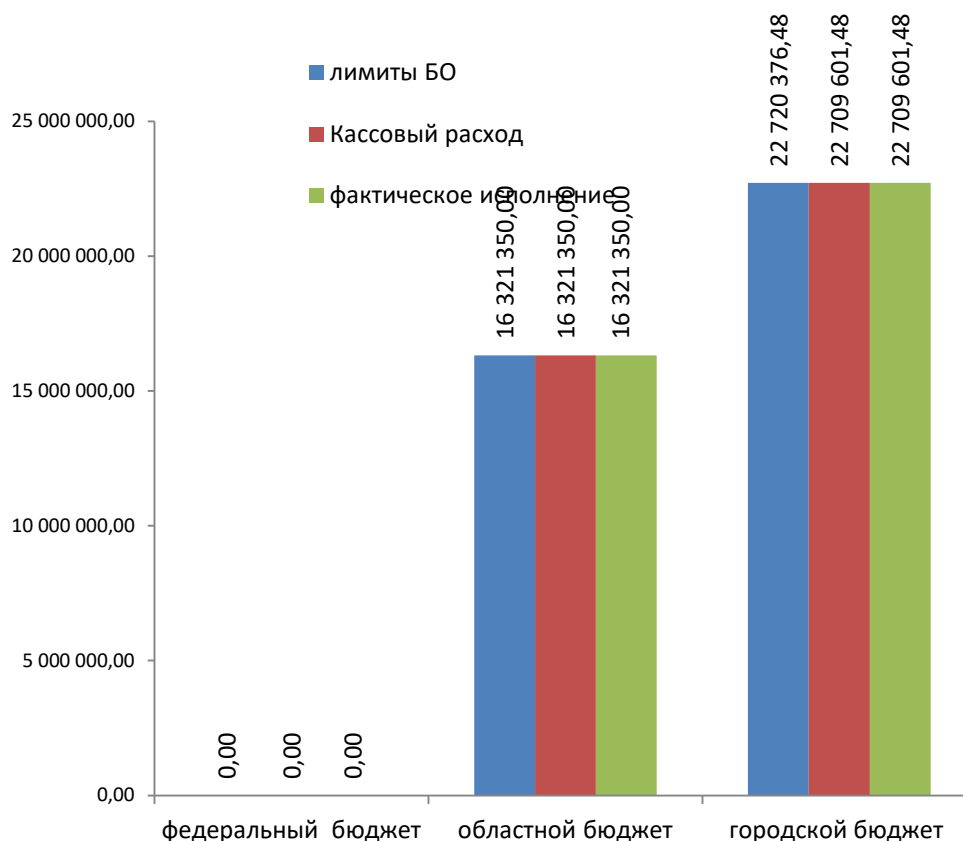

14. Муниципальный дорожный фонд.

В соответствии со ст.15,17 Городского положения Волжской городской Думы от 05.04.2012 № 265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Волгоградской области» и п.4.1 «Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области» (утверждено Решением Волжской городской Думы от 13.12.2013 № 17-ВГД) (далее по тексту – Положение о МДФ), «Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее по тексту – КБ и ДХ) в «Контрольно-счетную палату» ежеквартально предоставляется информация по использованию муниципального дорожного фонда.

В соответствии с решением Волжской городской Думы от 19.12.2018 №14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждено средств муниципального дорожного фонда (далее по тексту – МДФ) в сумме 300 994 609,00 рублей (в редакции от 14.06.2019 №42-ВГД), в соответствии со сводной бюджетной росписью 300 994 091,59 рублей.


В соответствии с п.4.2. р.4 Положения о МДФ остатки бюджетных ассигнований МДФ, не использованные в отчетном финансовом году, направляются на увеличение ассигнований МДФ в текущем финансовом году. Неиспользованный остаток в 2018 году составил 3 290 449,39 рублей.

Всего средства МДФ на 2019 год составили 304 284 540,98 рублей.

В 2019 году КБ и ДХ за счет средств МДФ заключены муниципальные контракты на сумму 299 843 372,20 рублей (см.р.14 таблицы №1).

На отчетную дату в счет средств МДФ фактическое исполнение составило 299 670 678,60 рублей или 98,48% от установленных лимитов, кассовый расход составил 299 040 192,85 рублей или 98,28%. Остаток средств МДФ по состоянию на 01.01.2020 год составляет 5 244 348,13 рублей. По информации КБ и ДХ сложившаяся кредиторская задолженность в размере 630 485,75 рублей будет погашена в первом квартале 2020 года.

Освоение финансовых средств по использованию средств муниципального дорожного фонда в 2019 году:

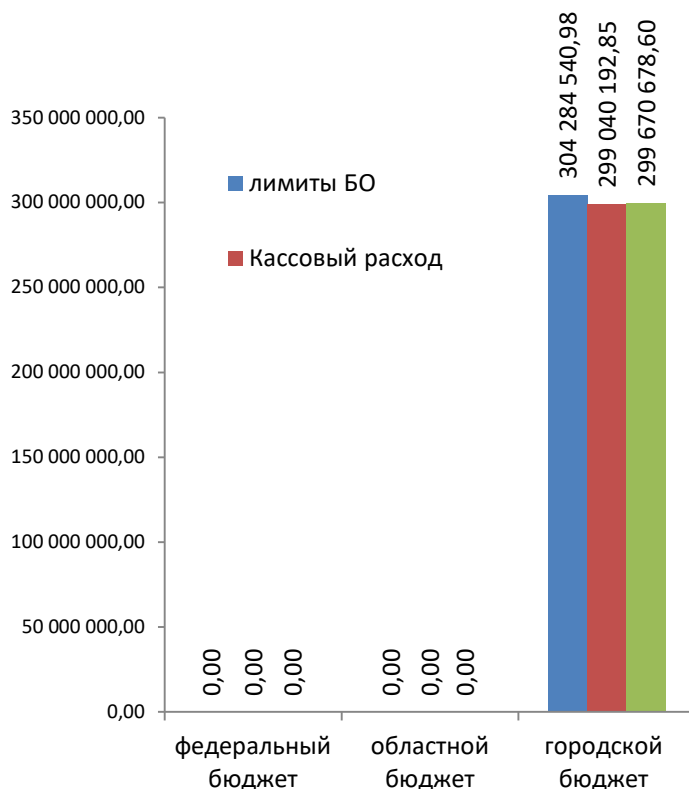

15. Проведение дополнительных проверок и мероприятий.

1) По приглашению администрации городского округа 31.05.2019 принято участие в совещании по вопросу применения коэффициентов, начисляемых в соответствии с п. 4.7 «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» - МДС 81-35.2004, на работы, выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в сметной документации на ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС. Представителям УКС и подрядных организаций даны разъяснения по порядку применения вышеуказанных коэффициентов.

2) По приглашению администрации городского округа 14.08.2019 года принято участие в совещании по вопросу оплаты затрат на возведение временных зданий и сооружений на объекте «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37

микрорайон)». Представителям УКС и подрядных организаций даны разъяснения по нормативным требованиям к порядку оплаты затрат на возведение временных зданий и сооружений на строительных объектах города Волжский, работы на которых финансируются за счет бюджетной системы

3) На основании запроса УВД МВД России по городу Волжскому проведено мероприятие по оценке работ, выполненных при устройстве уличной спортивной площадки на территории МОУ СШ №3 г. Волжский. По итогам мероприятия в УВД предоставлены соответствующая справка и ориентировочный сметный расчет стоимости вышеуказанных работ.

4) По приглашению администрации городского округа 15.11.2019 года принято участие в совещании по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию тепломагистрали ТМ-25. По данному вопросу представителям УКС и подрядных организаций даны разъяснения с позиции существующего законодательства.

5) На основании запроса УВД МВД России по городу Волжскому проведено мероприятие по оценке работ, выполненных при устройстве пожарного водопровода в здании МОУ СШ №2. По итогам мероприятия в УВД предоставлены соответствующие расчеты отклонений, составленные по каждому виду выполненных работ.

Ведущий инспектор контрольно-ревизионной инспекции
«Контрольно-счётной палаты городского округа —
город Волжский Волгоградской области»

В.В. Близнюк

Согласовано:

Начальник контрольно-ревизионной инспекции
«Контрольно-счётной палаты городского округа —
город Волжский Волгоградской области»

В.Д. Журавлев
